## UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

## Semestrální práce A

Semestrální práce z předmětu Modelování a simulace Ondřej Fialka

#### Scénář


Vedoucí týmu vývojářů je zodpovědný za vedení a řízení zákaznického projektu ALFA, který vyžaduje provedení vícera elementárních vývojových činností.

# Pro potřeby analýzy projektu a informování zákazníka je nutné určit následující ukazatele:


- a) TP odhad finanční náročnosti projektu, je-li požadována cca 60% pravděpodobnost dodržení tohoto odhadu,
- b) UP pravděpodobnost dodržení rozpočtu projektu do 35 tisíc Kč včetně.

### 1 Změřené hodnoty pomocí Javy

#### 1.1 třídy



a	Cinnosti
+get	Cinnost1(): double
+get	Cinnost2(): double
+get	Cinnost3(): double
+get	Cinnost4(): double
+get	Cinnost5(): double
+get	Cinnost6(): double
+get	Cinnost7(): double
+get	Cinnost8(): double
+get	Cinnost9(): double
Ľ	



#### 1.2 počet simulací

Počet simulací byl 14 925. Poté byl rozdíl směrodatných odchylek menší než 0.0000001 a program byl přerušen.


#### 1.3 TP

62,01% je mezi 28 a 34 tisíci.

#### 1.4 UP


Ze simulace vychází že, pravděpodobnost projektu do 35 tisíc korun je 86,39%.

#### Procentuální šance na finální cenu projektu

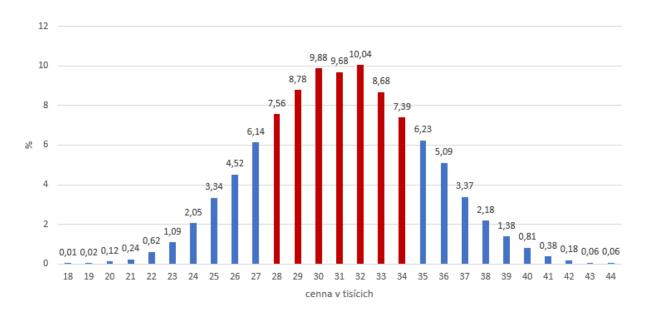

## 2 Změřené hodnoty v programu Arena

#### 2.1 model



#### 2.2 Počet simulací

Počet simulací jsem zvolil stejný jako v programu v jave. Počet simulací tedy byl 14 925.

#### 2.3 TP

60,89% je mezi 28 a 33 tisíci.

#### 2.4 UP

Ze simulace vychází že, pravděpodobnost projektu do 35 tisíc korun je 94,11%.

procentuální šance na finální cenu projektu

